


Raadsvoorstel: Beschikbaar stellen aanvullend krediet project Dordtse Mijl – bijlage 4

Planning uitvoering Dordtse Mijl

Voor de Dordtse Mijl is een maximale uitvoeringsduur, vanwege de BIRK subsidie, gelimiteerd tot medio 2023. Om ervoor te zorgen dat de stad zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden is de planning van de uitvoeringsfasering van Dordtse Mijl zo veel mogelijk afgestemd met de overige infrastructurele werken in en om Dordrecht. Met name het groot onderhoud aan de N3 heeft om maximale afstemming gevraagd. Er is gebleken dat een groot deel van de werkzaamheden niet gelijktijdig met de N3 uitgevoerd kon worden. Daarom moest een aantal fases snel opgestart worden om de bouw van het tankstation te realiseren. De resterende fases zullen worden opgestart nadat het groot onderhoud aan de N3 reeds is uitgevoerd (gepland medio 2022). In de tussentijd zullen diverse onderdelen van het ontwerp die geen verkeerhinder geven, maar wel essentieel zijn voor aansluiting van de vervolgfases worden uitgevoerd zodat het werk niet helemaal stil ligt.

Hieronder reeds uitgevoerde werkzaamheden en nog uit te voeren:

1. Fase 1, Riool en fietspad: De rioolvervanging Mijlweg en het verleggen fietspad Laan der VN, t.b.v. de bouw van het nieuwe tankstation, wordt gecombineerd uitgevoerd. (gereed)
2. Fase 2 A t/m G Laan der VN: Uitvoering Mijlweg tot ca. 100 m voor het kruispunt Ampèrestraat-Handelskade. Wisseling van weggedeelten voor verkeersafhandeling en werkzaamheden. (gereed)
3. Fase 1B Tankstation: uitvoering bouw van het tankstation. Aansluitend start de ontmanteling van het bestaande en te vervallen tankstation aan de Dokweg. (gereed)
4. Graffiti festival onder de bruggen 2020 (gereed)
5. Kademuuren Mijlsehaven (incl. aansluiting Handelskade), (in uitvoering)
6. Omleggen kabels en leidingen nabij tankstation Dokweg, na verwijdering tankstation (in voorbereiding),
7. Fase 7 Het Rivierenpark (2021):
 - Uitvoering Rivierenpark vindt plaats nadat K&L zijn omgelegd en de kademuur Dokweg is gerealiseerd.
 - Het gebied onder de bruggen - Fase 6 (2021)

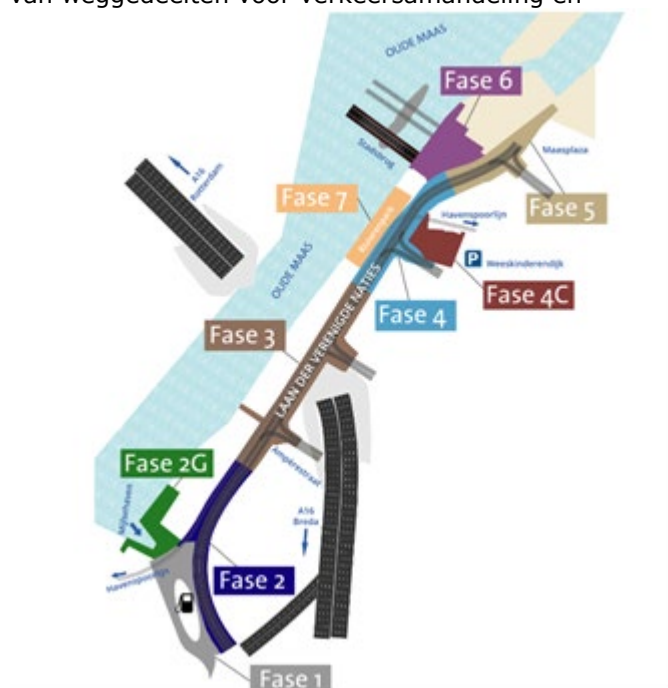

uitvoeringsfasering Dordtse Mijl

8. Werkzaamheden na groot onderhoud N3:

Nadat het groot onderhoud aan de N3 is uitgevoerd (gepland medio 2022) kunnen ook de resterende fases - fase 3, 4 en 5 - starten (zie bijgevoegde overzichtstekening van de uitvoeringsfasering).
